CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORME DE AUDITORIA DESEMPEÑO No. 145 DE 2016

Recursos de regalías para proyectos de inversión del sector Ciencia, Tecnología e Innovación - CTeI - contenidos en el concepto de distribución del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTeI - del SGR.

GITVCFMi-REGALIAS No. ___92___

MAYO DE 2016

Carrera 69 No 44 - 35 • PBX: 6477000 • cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia

el aplicativo GESPROY semáforo en rojo, indicando el atraso de la actividad. Dado lo anterior, se mantiene la observación administrativa.

7.1.4.1.3. Universidad Industrial de Santander

Observación 28. Productos Proyecto de inversión BPIN 2012000100092 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL PARQUE TECNOLÓGICO DE GUATIGUARÁ.

Para el proyecto de inversión BPIN **2012000100092, se evidencia que no se está cumpliendo con lo establecido en la planeación,** ya que se encuentran productos no entregados o con semáforo en rojo en varias actividades, especialmente las concernientes al edificio para unidades empresariales I+D (fase 1 y 2) y demás obras civiles de adecuación.

Imagen 10. *Consulta GESPROY*

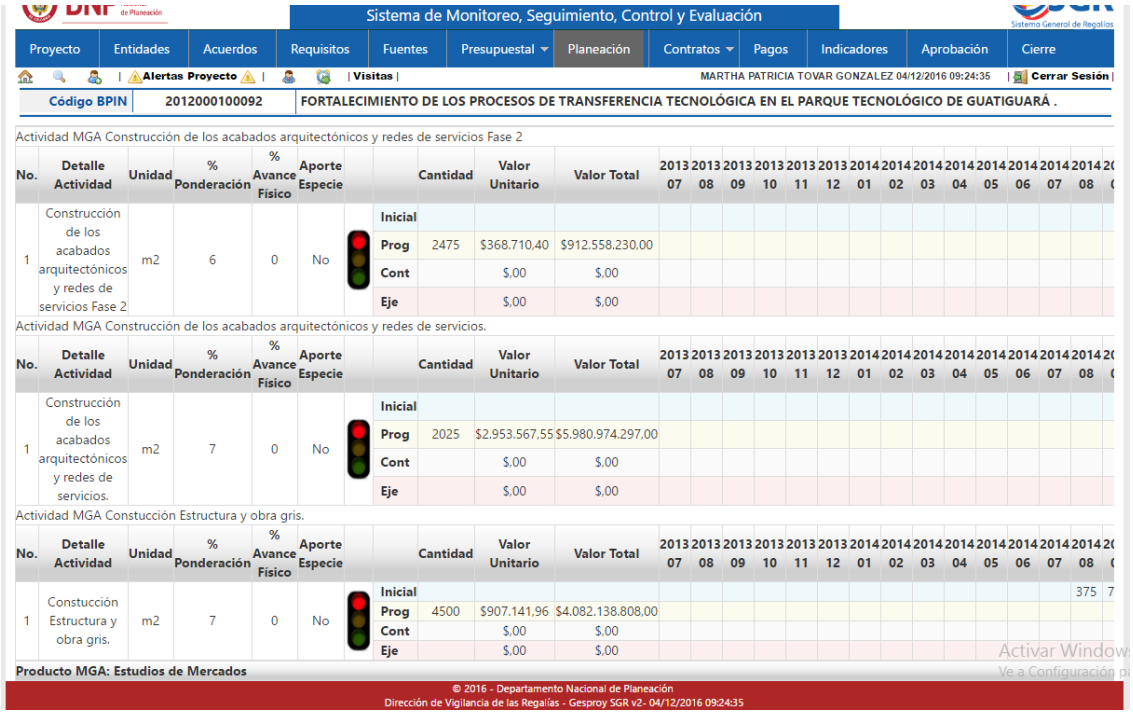

Fuente GESPROY. Consulta 1 diciembre 2016.

El avance reportado en el GESPROY y el tiempo transcurrido de ejecución (40 meses) del proyecto deja en evidencia las demoras en la ejecución del proyecto y la dificultad que se tendrá para cumplir con los plazos establecidos en la programación.

Al 2 de noviembre de 2016 han transcurrido 40 meses desde la fecha de inicio reportada en el GESPROY, es decir, va transcurrido el 83% del tiempo de ejecución del proyecto y solo se presenta un avance del 40%, evidenciándose un retraso en la ejecución del convenio y desarrollo del proyecto.

Lo anterior es resultado de haber comenzado la ejecución de actividades del proyecto que están en la línea crítica de la programación del proyecto de manera tardía, retraso que afecta el tiempo de ejecución del proyecto y la entrega de los productos.

Por lo anterior se comunica una observación administrativa, con hechos de relevancia significativa por las consideraciones expuestas en la observación comunicada

Respuesta del ejecutor y análisis equipo auditor: La entidad manifiesta que el retraso se debe al cargue tardío de la información y avances al sistema y afirma que realizara la revisión de la programación para ajustar la información a la realidad de la ejecución.

El equipo auditor considera que las razones expuestas por la entidad aplican para algunas actividades. Sin embargo, hay otras actividades que siguen con retraso debido al tiempo que transcurrió desde el inicio del proyecto y cuando se comenzaron a ejecutar las actividades del mismo. Prueba de eso es que aún no se ha iniciado la construcción del segundo edificio contemplado en el proyecto. Por lo anterior se mantiene la observación administrativa.

Observación 29. SUPRESIÓN DE PARTICIPANTES y ACTIVIDADES DEL PROYECTO BPIN 2013000100011 DESARROLLO INVESTIGACIÓN APLICADA PARA CONTRIBUIR A UN MODELO EFECTIVO Y SOSTENIBLE DE INTERVENCIÓN DEL DENGUE EN SANTANDER, CASANARE Y VALLE DEL CAUCA.

Mediante acuerdo N° 001 de 2012 (20 de Diciembre) en Artículo N°20 se realiza la aprobación y designación como ejecutor del proyecto, no obstante mediante Acuerdo N°002 de 2013 se Ratifica la aprobación del mismo, en el Acuerdo N°009 de 2013 se aprueban los ajustes y en el Acuerdo N°0047 de 2015 se hace una adición Presupuestal, el proyecto BPIN 2013000100011 DESARROLLO INVESTIGACIÓN APLICADA PARA
